


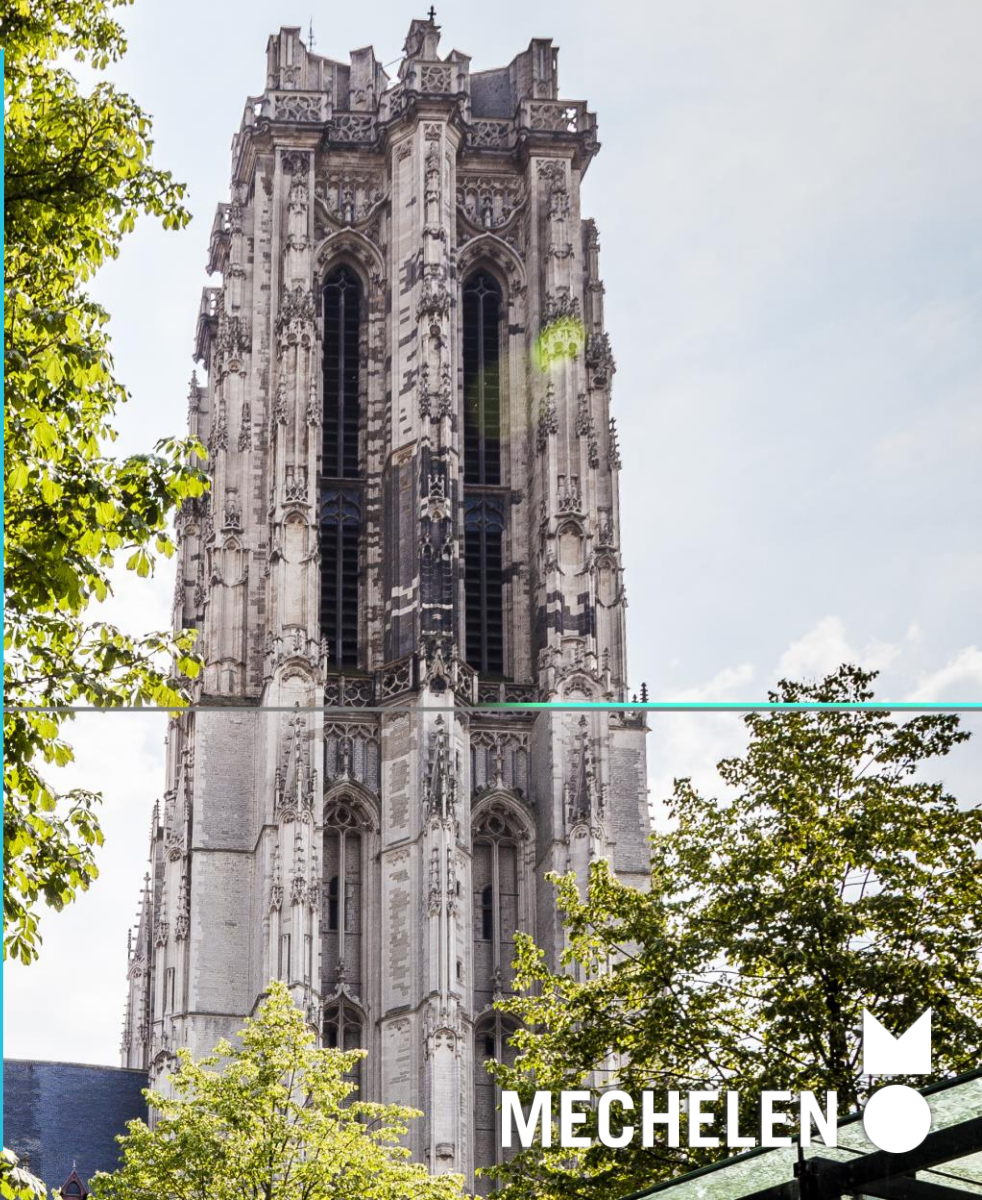

TOELICHTING

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

ZAAL RERUM NOVARUM, SINT-LAMBERTUSLAAN 18

15 NOVEMBER 2023

MECHELEN 



WERKEN MUIZEN

- Burgemeester Bart Somers: verontschuldigd
- Schepen openbare werken: Patrick Princen
- Projectcoördinatoren: Kurt Feremans en Tine Van den Bogaert
- Minder-Hindercoördinator: Andy Frans
- Communicatie: Benn Van Campenhout - verontschuldigd
- Advies en ontwerp: D+A Consult: Margot Stoffels
- Aannemer Hegrola: Jan Wittewrongel



WERKEN MUIZEN

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



WERKEN MUIZEN

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen

WERKEN MUIZEN

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

DEELPROJECTEN

MUIZENHOEKSTRAAT/TER DONCKLAAN – MAGDALENASTEENWEG - BRUGSTRAAT



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PARTICIPATIE

DEELPROJECT 1: Muizenhoekstraat en Ter Doncklaan

- Gestart als onthardingsproject vanuit het RE-MOVE onderzoek.
- Op 27/5/2021 wordt een online infomoment georganiseerd over de plannen in de Muizenhoekstraat en de wijk Ter Donck. RE-MOVE licht de onderzoeksmethodiek en het concept toe.
- Op zaterdag 5 juni 2021 worden er wandelingen georganiseerd waarbij de bewoners van de Muizenhoekstraat en de wijk Ter Donck input kunnen geven over de voorstellen.
- Tegelijkertijd kan er in de periode mei-juni 2021 een online vragenlijst worden ingevuld waarbij keuze is uit verschillende concepten en input kan worden gegeven.
- Op dinsdag 14 mei 2022 worden de aangepaste plannen toegelicht. Kleine wijzigingen worden nog meegenomen in het aanbestedingsdossier.
- Infomoment start van de werken 15/11/2023.



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

MUIZENHOEKSTRAAT – TER DONCKLAAN


Bestaande toestand



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

MUIZENHOEKSTRAAT – TER DONCKLAAN

Ontworpen toestand

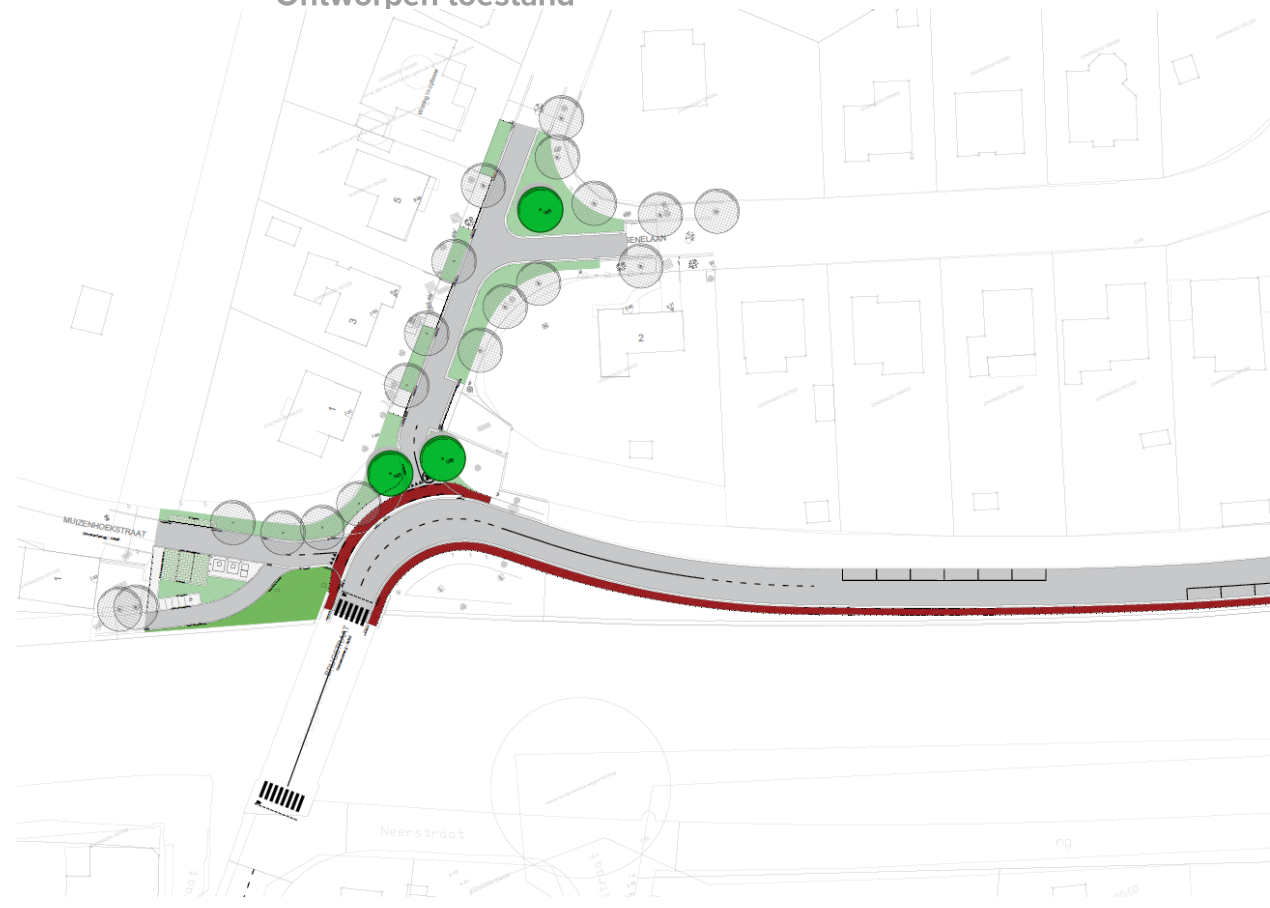


- verhoogd fietspad – bocht Rijmenamsesteenweg naar brug
- nieuw fietspad zuiden
- ontharden kruispunten en Ter Doncklaan
- afgebakende parkeervakken:
 - 14 st Rijmenamsesteenweg
 - 7 st Brugstraat
- 3 groene parkeervakken t.h.v. Brughuis
- fietsparking en fietsherstelzuil
- ondergrondse glascontainers
- vernieuwen toplaag asfalt

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PARTICIPATIE

DEELPROJECT 2: Magdalenasteenweg

- Gestart als fietsproject.
- Omdat dit werken zijn met een grotere impact dan bij een standaard fietsproject, wordt er een uitgebreide infobrief verstuurd op 27/12/2021 waarbij de werken gedetailleerd worden toegelicht.
- Eind 2022 start het project Leefbuurt Muizen op. De Magdalenasteenweg ligt in het te onderzoeken gebied en het plan voor de werken in de Magdalenasteenweg wordt tijdens de workshops (voorjaar 2023) met de stakeholders (aantal bewoners vanuit verschillende verenigingen uit Muizen) besproken. De gegeven input wordt verwerkt in de toekomstvisie en de plannen t.h.v. het kruispunt met de Brugstraat worden aangepast.
- Infomoment start van de werken 15/11/2023.

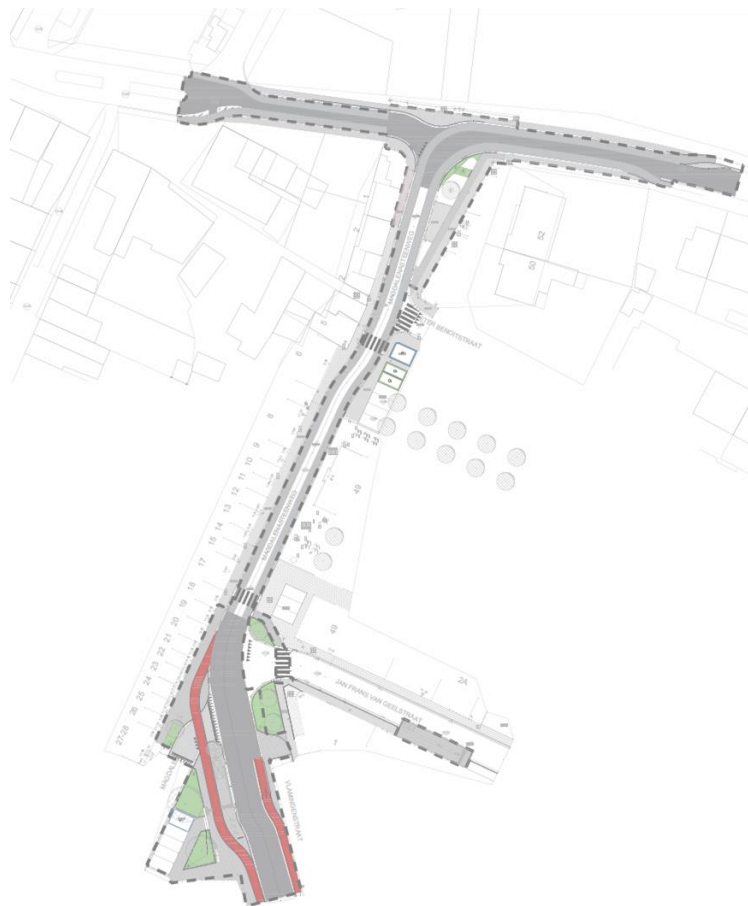



Bestaande toestand



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

MAGDALENASTEENWEG

Ontworpen toestand



- fietssuggestiestroken kruispunt Muizen-Dorp/
Magdalenasteenweg/Brugstraat
- heraanleg kruispunt: Brugstraat/Magdalenasteenweg
= voorrangsrichting
- twee nieuwe verhoogde bushaltes
- fietspad achter bushalte
- rugdekking fietsers
- vergroening kruispunt
- parking voor mensen met een beperking
- verlies 7 parkeerplaatsen
- vernieuwen asfalt rijbaan Brugstraat


VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

BRUGSTRAAT

Bestaande toestand



Ontworpen toestand

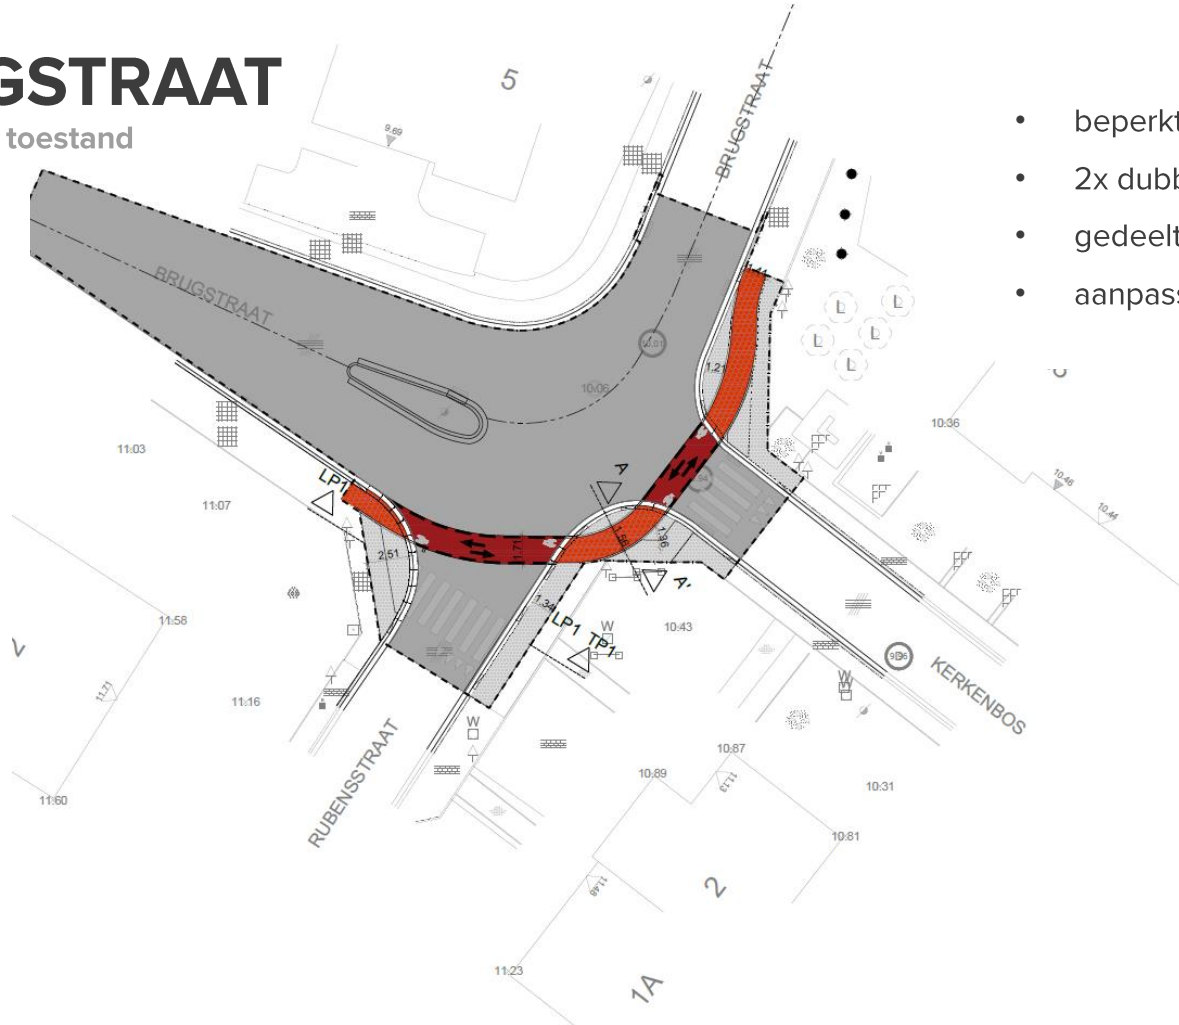

- beperkte ingrepen
- 2x dubbelrichting fietsoversteek
- gedeeltelijke heraanleg voetpaden
- aanpassen belijning en signalisatie



WERKEN MUIZEN

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Vragen



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 1: Muizenhoekstraat en Ter Doncklaan

Fase 2: busperron Jan Frans Van Geelstraat

Fase 3: parking Magdalenasteenweg

Fase 4: Magdalenasteenweg t.h.v. Stationsberg

Fase 5: Magdalenasteenweg bocht Brugstraat – Muizendorp tot kerkplein

Fase 6: bocht Brugstraat - Kerkenbos

Fase 7: Rijmenamsesteenweg

Fase 8: asfaltering

Fase 9: ontharding Ter Doncklaan aansluiting Bonheidensteenweg – knip Muizenhoekstraat

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 1: Muizenhoekstraat en Ter Doncklaan

Start van de werken: week van 20 november

Wat doen we?

- ontharden van de straathoeken met de Jan van Musenelaan, de Rijmenamsesteenweg en de Muizenhoekstraat.
- aanplanten van enkele bomen.
- vernieuwen van het fietspad in de bocht met de Rijmenamsesteenweg.
- vernieuwen van het asfalt in de rijbaan in deze zone



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER


Fase 1: Muizenhoekstraat en Ter Doncklaan

Bereikbaarheid en circulatie:

Muizenhoekstraat, Ter Doncklaan en Jan van Musenelaan worden doodlopend op de werfzone:

- de stop aan de Bonheidensteenweg wordt tijdelijk weggenomen zodat de Ter Doncklaan en de Jan van Musenelaan bereikbaar blijven tot aan de werfzone
- heel de Muizenhoekstraat is enkel te bereiken via de Bonheidensteenweg
- met de fiets aan de hand blijft de verbinding met het jaagpad open.

Woningen binnen de werfzone blijven bereikbaar.
Fietzers rijden door de werfzone op de rijbaan.

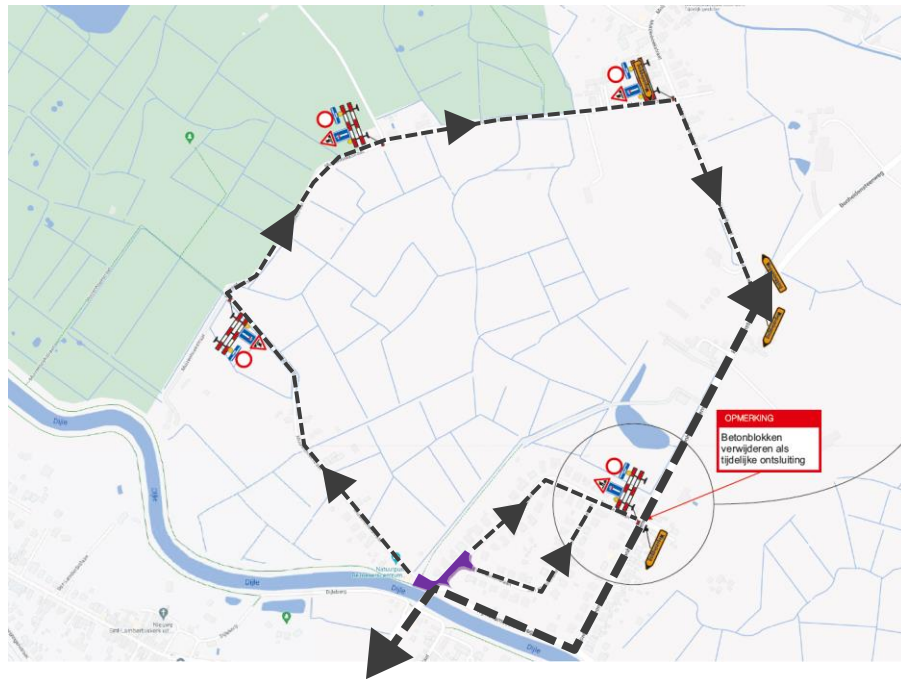

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 2: busperron Jan Frans Van Geelstraat


Start van de werken: na werken Ter Doncklaan.
Afhankelijk van het weer, nog in 2023.

Wat doen we?

- vernieuwen van de bushalte

Bereikbaarheid en circulatie:

- plaatselijk inname één rijstrook
- stopplaats lijnbus blijft bestaan

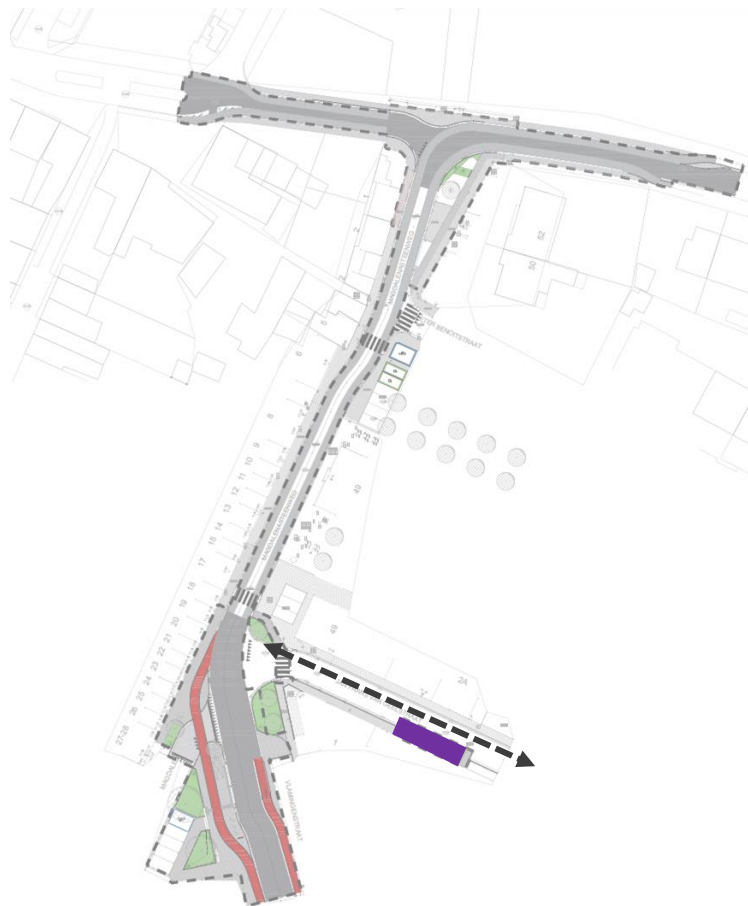

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 3: parking aan Magdalenasteenweg


Start van de werken: afhankelijk van alle werken nog net voor kerst of anders mee in fase 4

Wat doen we?

- voorbereidende werken in de zone buiten de rijbaan: opbreken parkeerplaatsen en trappen
- voorbereidingen voor verplaatsen bomen

Bereikbaarheid en circulatie:

- geen omleiding nodig
- plein wordt wel afgesloten

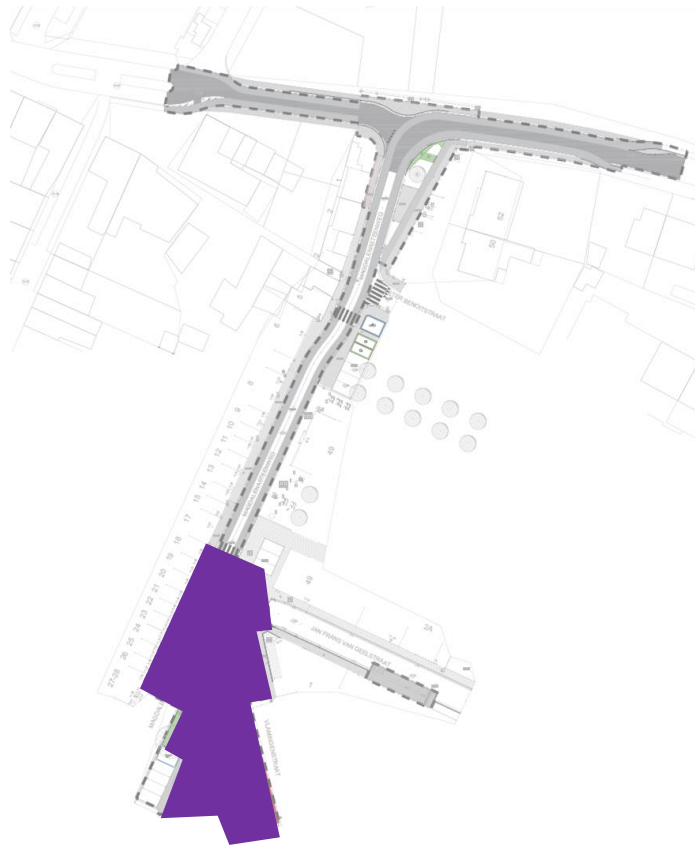



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

CIRCULATIE VANAF WERKEN MAGDALENASTEENWEG

Circulatie doorgaand verkeer via :

- N26 – Leuvensesteenweg
- B101 – Tangent
- N15 - Nekkerspoel



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 4: Magdalenasteenweg t.h.v. Stationsberg

Start van de werken: vanaf 8 januari 2024 – na bouwverlof

Wat doen we?

- verdere afwerking plantvakken
- aanpassen rijbaan
- aanleg fietspad
- aanleg busperron


VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 4: Magdalenasteenweg t.h.v. Stationsberg

Bereikbaarheid en circulatie:

- Magdalenasteenweg onderbroken
- Jan Frans van Geelstraat, Stationsberg en Magdalenasteenweg doodlopend op de werf
- voorstel: de lijnbus rijdt via Brugstraat en Peter Benoitstraat
- fietsers rijden via Karolingenstraat - Rubensstraat - Vlamingenstraat of via Karolingenstraat - August Lenaertsstraat in beide richtingen.
- bereikbaarheid via Smisstraat voor al het andere plaatselijk verkeer.

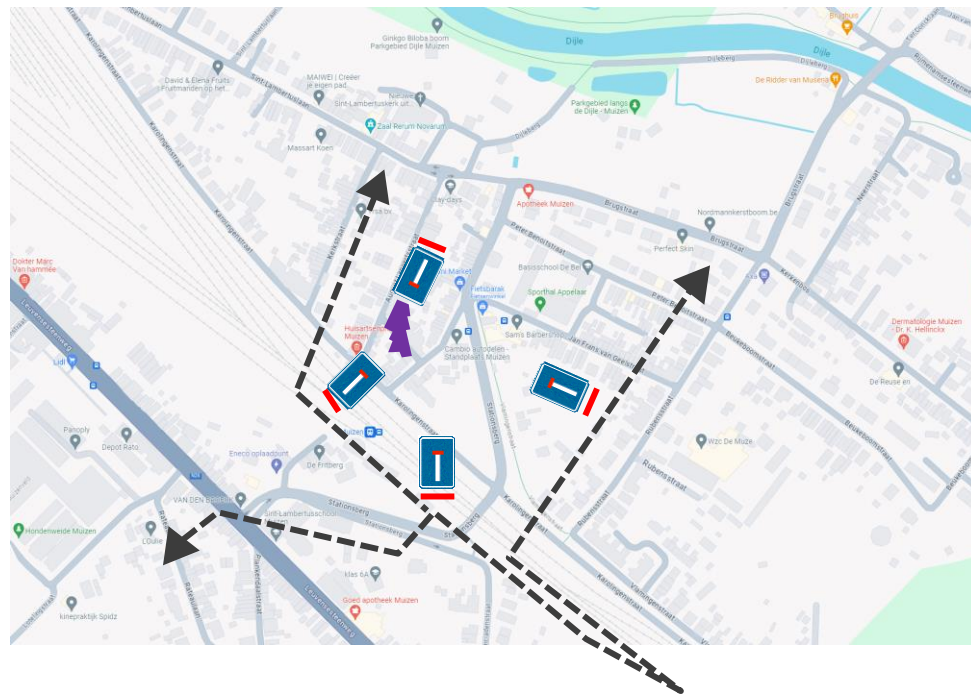

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 5: Magdalenasteenweg bocht Brugstraat – Muizendorp tot kerkplein

Start van de werken: rond eind januari/ begin februari

Wat doen we?

- aanpassingen bocht Magdalenasteenweg en Brugstraat
- aanleg fietssuggestiestroken en overgangen naar fietspad
- vernieuwen asfalt Brugstraat
- gedeelte Muizendorp tot kerkplein aanpassen:
 - fietspaden naar fietssuggestiestroken
 - verwijderen versmallingen
 - overgangen van fietssuggestiestroken naar fietspaden
 - toplaag asfalt in dit gedeelte nu of in latere fase




VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 5: Magdalenasteenweg bocht Brugstraat – Muizendorp tot kerkplein

Bereikbaarheid en circulatie:

- via Smisstraat kan je tot aan het kerkplein , ook deel Sint-Lambertuslaan tot plein
- lijnbus kan terug via Stationsberg langs Jan Frans van Geelstraat en Peter Benoitstraat (omdraaien van rijrichting)

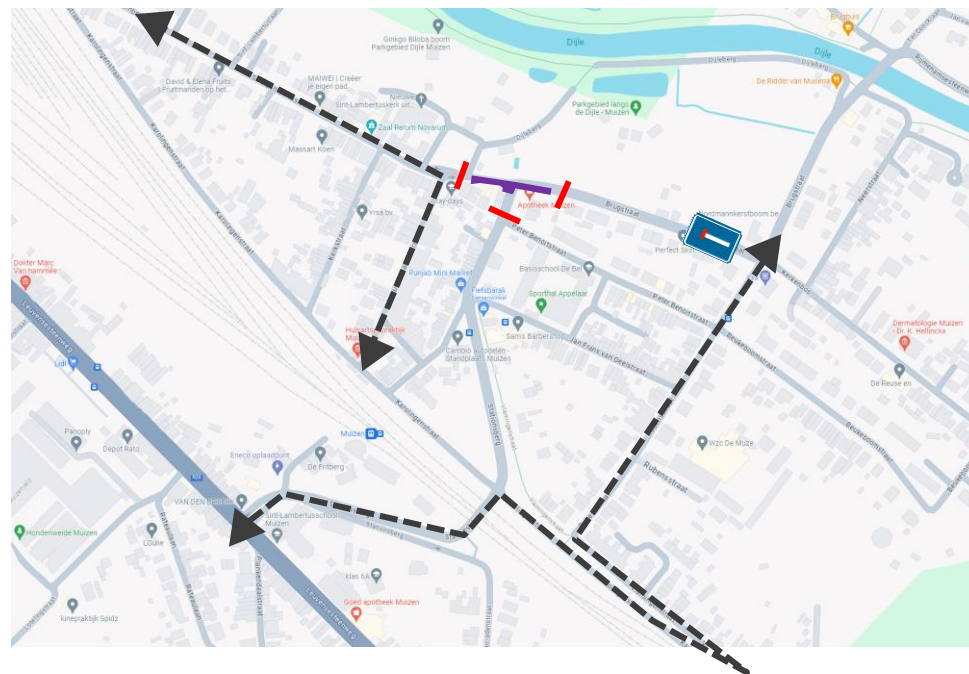



- 




VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 6: bocht Brugstraat - Kerkenbos

Bereikbaarheid en circulatie:

- verkeer Kerkenbos via Beukenboomstraat, Vlamingenstraat of via Jan Frans van Geelstraat

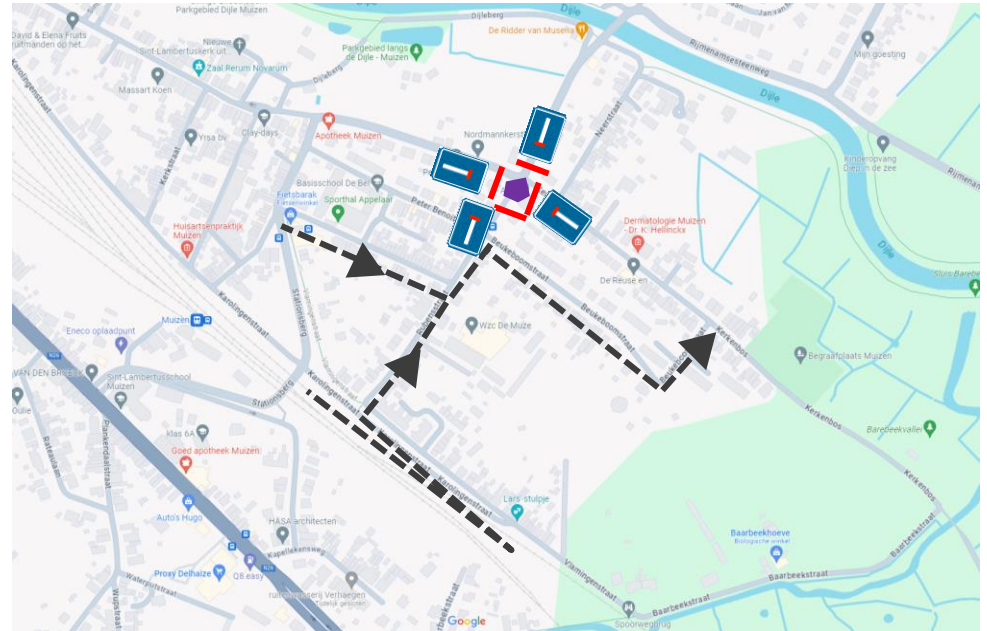

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 7: Rijmenamsesteenweg


Start van de werken: maart

Wat doen we?

- fietspad kant Dijle vernieuwen: betonstenen worden vervangen door rood/bruin asfalt
- rijbaan enkel toplaag
- schilderen van parkeerplaatsen

Bereikbaarheid en circulatie:

- centrum via Stationsberg

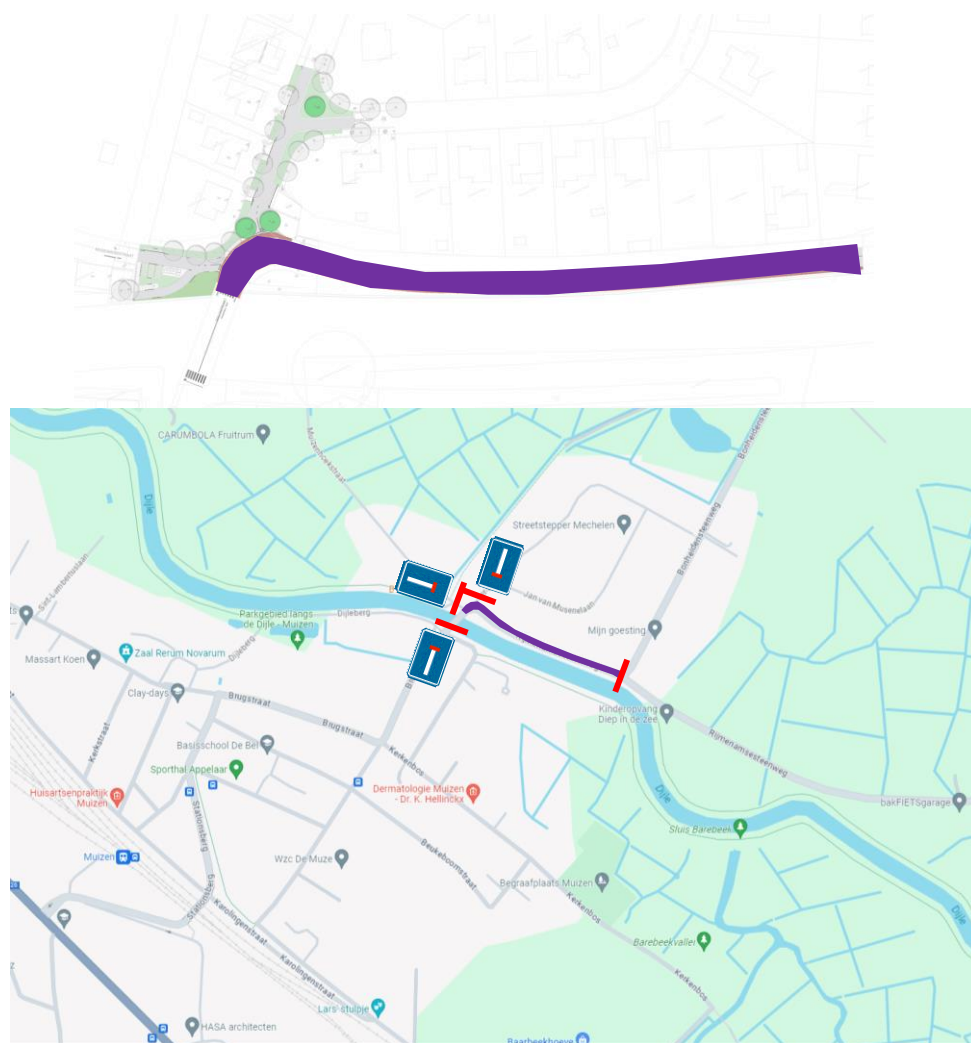

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 8: asfaltering

Start van de werken: maart

Wat doen we?

- asfaltering (toplaag) alle voorgaande fase

Bereikbaarheid en circulatie

- geen lijnbus gedurende één week
- bereikbaarheid verloopt gefaseerd
- moeilijke fase



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN


PLANNING AANNEMER

Fase 9: ontharding Ter Doncklaan aansluiting Bonheidensteenweg – knip Muizenhoekstraat

Start van de werken: eind maart

Wat doen we?

- aanleg plantvakken
- doorgang in betonstraatstenen met afsluitpalen
- Muizenhoekstraat t.h.v. huisnr 25: afsluiting met palen (2 vaste- en 1 wegneembare paal)

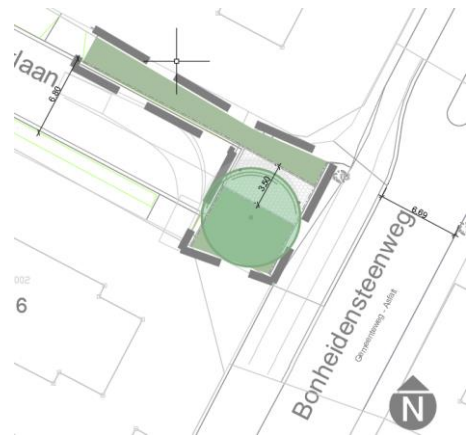


VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

PLANNING AANNEMER

Fase 9: ontharding Ter Doncklaan aansluiting Bonheidensteenweg

- **Bereikbaarheid en circulatie:**
 - geen gevolgen
 - aansluiting met Rijmenamsesteenweg terug open

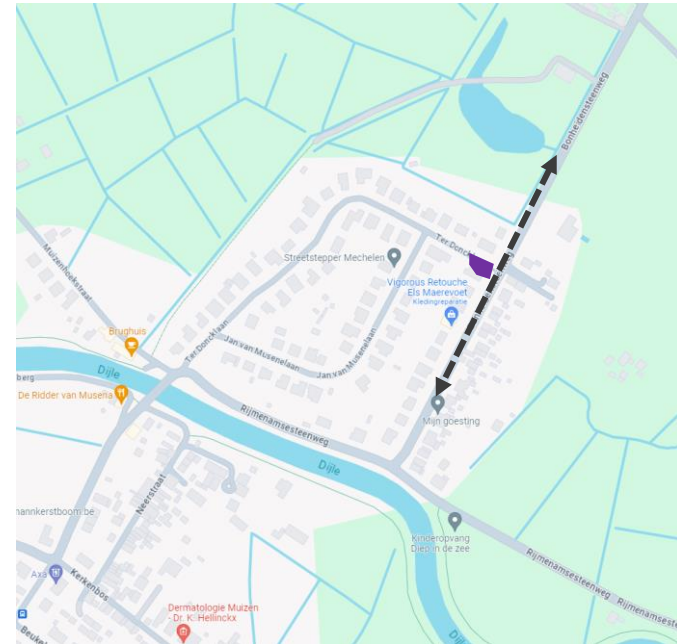

VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

Elke planning is onder voorbehoud van onvoorziene zaken
of het weer!



- 
1. Inleiding – Welkom
 2. Toelichting ontwerp
 3. Planning heraanleg
 4. Minder hinder
 5. Communicatie
 6. Vragen



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

COMMUNICATIE WERKEN

- Bewonersvergadering: 15 november – toelichting werken
- Brief fase 1 - start van de werken Ter Doncklaan
- Brief fase 2 - start van de werken begin 2024
- Website - mechelen.be/wegenwerken
 - alle aanpassingen up-to-date (huisvuilophaling – haltes De Lijn)
- Hoplr

- 
1. Inleiding – Welkom
 2. Toelichting ontwerp
 3. Planning heraanleg aannemer
 4. Minder hinder
 5. Communicatie
 6. Vragen



VERBETERINGSWERKEN MUIZEN

Vragen?



www.mechelen.be/wegenwerken
